


## Schlussbericht: Sanierung des Kunstrasenplatzes im Müritzstadion

Der Kunststoffrasenplatz ist ein Teil des Müritzstadionkomplexes und wurde 2001 als rein sandgefüllter Kunstrasenplatz errichtet. Mit einem Alter von 18 Jahren hatte der Kunstrasen das Ende seiner Nutzungszeit erreicht. Entsprechende Verschleißerscheinungen waren Faserabrieb, aufgerissene Bahnen- und Linienstöße und dadurch nicht mehr reparabel. Die Nutzungseigenschaften der Belagsoberfläche waren nicht mehr gegeben, es bestand ein erhöhtes Unfall- und Verletzungsrisiko. Die Neuverlegung eines Kunststoffrasens mit Sand/Gummi gefüllter Poltschicht gemäß DIN EN 15330-1 wurde von Ende Mai bis Ende Juli 2019 ausgeführt. Die Befüllung erfolgte mit Quarzsand und grünen EPDM Spezialgummigranulat. Nach der Verlegung erfolgte entsprechend der Vorgabe die Markierung des Fußballfeldes. Neue Einbauten sind 2 Fußballtrainingstore (7,32 x 2,44 m), 4 Jugendfußballtore (5,00 x 2,00 m) freistehend mit Kippsicherung, Tragegriffen und Lufträdern zum Transport sowie 4 Eckfahnen mit Gelenk in Bodenhülsen.

### Regelaufbau

Gesamtfüllhöhe aus EPDM und Quarzsand im Nutzungszustand min. 60% der Faserlänge (Grundbelag Typ 5 DIN EN 15330-1)  
 : bei 40mm Faserlänge = min. 24mm

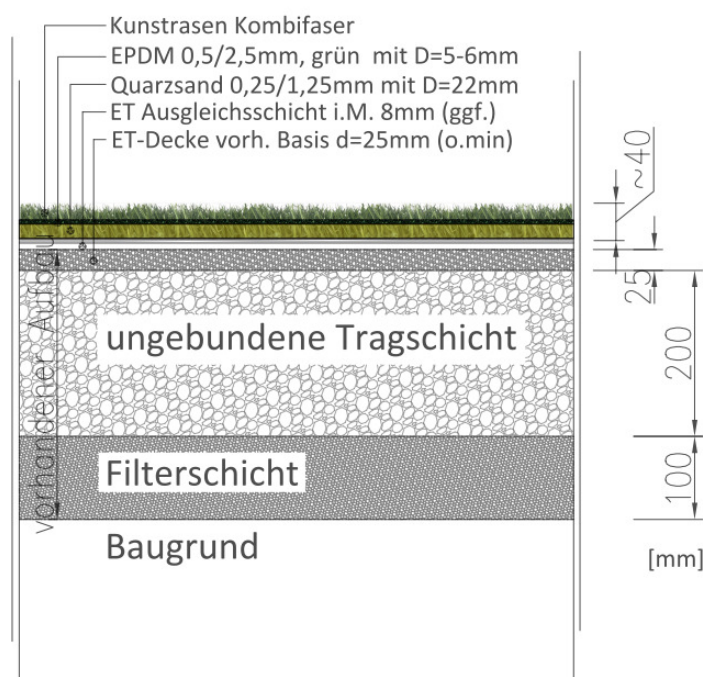

Lageplan



**Förderfonds:** Gewährung einer Zuwendung des Landes Mecklenburg-Vorpommern zur Förderung des Sportstättenbaus im Förderbereich 1 in Verbindung mit Mitteln aus dem „Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums“ (ELER) gemäß Richtlinie zur Förderung des Sportstättenbaus (Sportstättenbaurichtlinie-SportstbRLMV).

**Zuwendungsdatum:** 26.10.2018

**Mitteilung zum vorzeitigen Vorhabensbeginn:** 09.10.2018

**Gesamtkosten:** 345.100,66 €

**Förderhöhe:** Der Fördersatz beträgt 40% der zuwendungsfähigen Kosten abzgl. nat. Kofinanzierungsmittel

**Ausführung der Bauleistungen:** Mai bis Juli 2019
